



Objet de l'intervention :	Recherche de fuite		
Commune	St Laurent le Minier	Localisation	rue de la fontaine
Date de l'intervention	11/04/2013	Période	journée

Localisation

n°1

Conduite	AC	Diamètre	Ø 80 mm
----------	----	----------	---------

Matériel utilisé :

- | | |
|---|---|
| ☐ Corrélateur acoustique | ☒ Unité d'écoute au sol et en prise directe |
|---|---|

Résultat des investigations

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Absence de fuite | ☐ Fuite sur conduite principale | ☒ Fuite sur branchement |
| ☐ Fuite sur organe | ☐ Autre : | |

Commentaire :

Fuite sur le branchement de "Katia KIPEINT"

Positionnement de la fuite





Objet de l'intervention :

Recherche de fuite

Commune

St Laurent le Minier

Localisation

rue _____

Date de l'intervention

11/04/2013

Période

journée

Localisation

n°2

Conduite

AC

Diamètre

Ø 80 mm

Matériel utilisé :



Corrélateur acoustique



Unité d'écoute au sol et en prise directe

Résultat des investigations

☐ Absence de fuite☒ Fuite sur conduite principale☐ Fuite sur branchement☐ Fuite sur organe☐ Autre : _____

Commentaire :

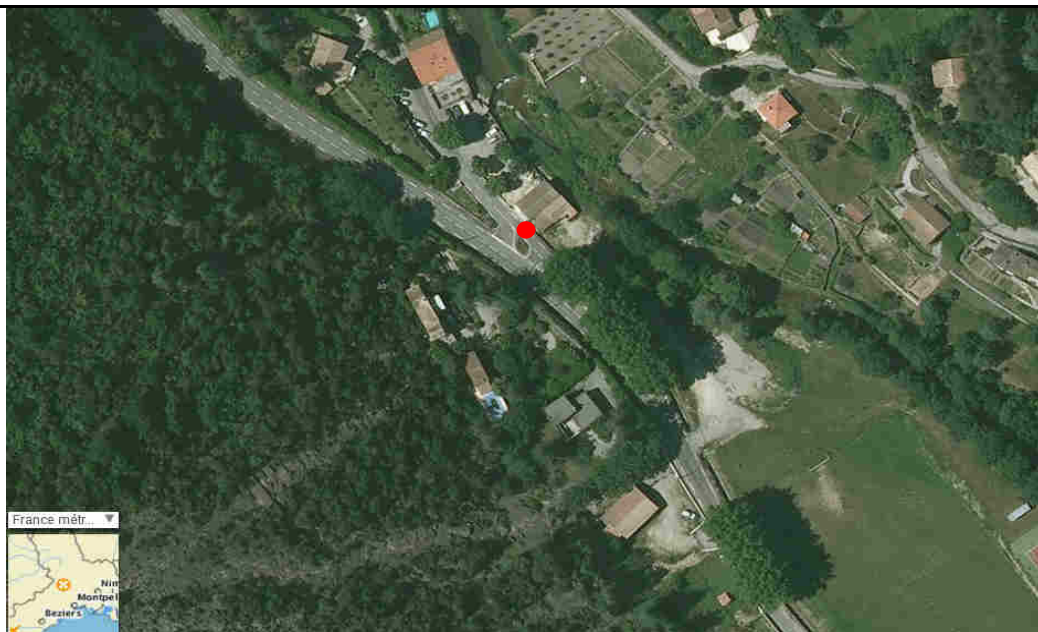
Positionnement de la fuite





Objet de l'intervention :	Recherche de fuite		
Commune	St Laurent le Minier	Localisation	rue antoine Carles
Date de l'intervention	11/04/2013	Période	journée

Localisation

n°3

Conduite	AC	Diamètre	Ø 125 mm
----------	----	----------	----------

Matériel utilisé :



Corrélateur acoustique



Unité d'écoute au sol et en prise directe

Résultat des investigations

☐ Absence de fuite	☒ Fuite sur conduite principale	☐ Fuite sur branchement
☐ Fuite sur organe	☐ Autre :	

Commentaire :

Positionnement de la fuite

